

Relatório de Desenvolvimento Ágil

1. Identificação do Projeto

Nome do projeto: Sistema de Agendamento de Serviços.

Nome da equipe: CodeStorm 5

Nome da equipe: Arsidney Martins, Edgar Neto, João Luís, Lucas Noronha, Roberto Figueiredo Guimarães.

Período de desenvolvimento: 05/05/2026 a 26/05/2026

Metodologia ágil utilizada: Kanban utilizando Jira Software.

2. Objetivo do Relatório

Apresentar de forma organizada as atividades realizadas pela equipe durante o desenvolvimento do sistema, destacando as práticas ágeis utilizadas, as entregas realizadas, os desafios enfrentados e os resultados obtidos ao longo do projeto.

3. Descrição do Projeto

O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento de agendamentos e atendimentos, permitindo maior organização dos serviços realizados e melhor controle das informações dos clientes.

Problema que o projeto busca resolver

Muitos estabelecimentos realizam agendamentos de forma manual, causando dificuldades no controle de horários, atendimentos, reagendamentos e histórico de clientes.

Público-alvo

Pequenos negócios, prestadores de serviços e empresas que necessitam organizar atendimentos e agendamentos.

Principais funcionalidades

- Login de acesso;
- Cadastro de serviços;
- Agendamento, Reagendamento, Em atendimento, Cancelamento e Concluído de atendimentos;
- Controle de status dos atendimentos;

Tecnologias utilizadas

- Frontend: HTML, CSS e JavaScript;
- Backend: Node.js
- Banco de dados: PostgreSQL/MySQL;
- Jira para organização das tarefas.

4. Organização da Equipe

A equipe foi organizada de forma colaborativa, dividindo as tarefas conforme as habilidades de cada integrante.

Papéis definidos na equipe

- Product Owner
- Desenvolvedor Frontend
- Desenvolvedor Backend
- Líder Técnico
- DB

Responsabilidades de cada integrante

- Lucas Noronha (PO) - Organizar as prioridades do projeto.
- Arsidney Martins - Desenvolvimento do frontend/Testes.
- Roberto Figueiredo Guimarães - Desenvolvimento do backend.
- Edgar Neto (DB) - Modelagem do banco de dados.
- João Luís (Líder Técnico) - Orientar a equipe nas decisões técnicas.

Forma de comunicação utilizada

- Reuniões presenciais e online.
- WhatsApp;
- Jira;

5. Práticas Ágeis Utilizadas

Metodologia adotada

A equipe utilizou a metodologia ágil Kanban através do Jira Software para organizar, acompanhar e controlar as tarefas do projeto durante o desenvolvimento do sistema. O método permitiu visualizar as atividades pendentes, em andamento e concluídas, facilitando a organização da equipe e o acompanhamento das entregas.

Planejamento das atividades

As tarefas foram divididas entre os integrantes de acordo com as funcionalidades do sistema e prioridade de implementação.

Quadro de tarefas

Foi utilizado um quadro Kanban no Jira para controle das atividades, acompanhamento do andamento e organização do backlog.

Reuniões realizadas

- Reuniões de planejamento;
- Reuniões de acompanhamento;

- Revisões das funcionalidades implementadas;
- Retrospectivas da equipe.

Divisão em ciclos de trabalho

O desenvolvimento foi dividido em pequenas entregas e etapas de implementação, permitindo ajustes contínuos durante o projeto.

6. Processo de Desenvolvimento

Levantamento de requisitos

Os requisitos foram definidos com base nas necessidades de organização de atendimentos e gerenciamento de clientes.

Prototipação ou planejamento visual

As telas e funcionalidades foram planejadas e desenvolvidas diretamente na etapa de implementação do sistema.

Implementação

Foram desenvolvidas funcionalidades de login, cadastro de serviços, sistema de agendamentos, controle de status dos atendimentos, integração com banco de dados e backend para gerenciar as informações.

Testes realizados

A equipe realizou testes funcionais para validar o funcionamento das telas, rotas, banco de dados e integração entre frontend e backend.

Ajustes e melhorias

Durante o desenvolvimento foram realizados ajustes no layout, correções de erros, melhorias nas regras de status dos atendimentos, otimização da integração com o banco de dados e melhorias na organização das funcionalidades do sistema.

7. Atividades Realizadas

Frontend - Visualização em formato de calendário dos agendamentos pendentes

Frontend - Criar formulário de cadastro de serviços

Frontend - Criar tela de login para autenticação do prestador

Formulário para agendamento de serviços

Backend - Criar endpoints de autenticação

DB - Criar entidade para usuários (prestadores)

DB - Criação do banco de dados com entidades do domínio

Integração Frontend - Backend

Backend - Criação de endpoints para cadastro de serviço

Backend - Endpoints para agendamento de serviço

Backend - Criação da API

8. Entregas Realizadas

- Protótipo inicial - Etapa de implementação - Concluída;
- Estrutura do banco - Criação das tabelas principais - Concluída;
- Tela de login e sistema de autenticação - Concluída;
- Sistema de agendamento - Controle de atendimentos - Concluída;
- Ajustes e testes - Correções e melhorias - Concluída.

9. Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento foram encontradas algumas dificuldades, como:

- Ajustes nas regras de status dos atendimentos;
- Nivelamento e passagem de conhecimento da plataforma do JIRA

10. Soluções Aplicadas

Para solucionar as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do projeto, a equipe realizou reuniões de alinhamento para redefinir as regras de negócio dos status dos atendimentos e melhorar a organização das tarefas. Também foram aplicados ajustes na integração entre frontend, backend e banco de dados, permitindo maior estabilidade no funcionamento do sistema. Além disso, a equipe utilizou o Jira Software para acompanhar as atividades, organizar o fluxo de desenvolvimento e facilitar a comunicação entre os integrantes, contribuindo para a resolução dos problemas identificados ao longo do projeto.

11. Resultados Obtidos

A equipe conseguiu concluir as funcionalidades previstas para o sistema.

Resultados alcançados

- Implementação das telas principais;
- Estruturação do banco de dados;
- Desenvolvimento do sistema de login;
- Cadastro de clientes e serviços;
- Organização das tarefas utilizando práticas ágeis.

Práticas ágeis que ajudaram no desenvolvimento

- Organização do backlog;
- Controle visual das tarefas;
- Melhor acompanhamento do progresso;
- Facilidade na adaptação de mudanças.

Aprendizados adquiridos

- Trabalho em equipe;
- Organização de projetos ágeis;
- Uso de ferramentas de versionamento;
- Integração entre frontend, backend e banco de dados.

12. Retrospectiva da Equipe

O que funcionou bem

- Comunicação entre os integrantes;
- Organização das tarefas;
- Uso do quadro Kanban;
- Divisão das responsabilidades.

O que poderia ter sido melhor

- Melhor gerenciamento do tempo;
- Mais testes durante as implementações;
- Maior frequência de reuniões de alinhamento.

O que a equipe faria diferente

- Planejamento mais detalhado das funcionalidades;
- Melhor definição inicial das regras de negócio;
- Maior antecipação dos testes e validações.


13. Conclusão

Conclui-se que o uso de práticas ágeis contribuiu significativamente para a organização da equipe e para o acompanhamento das atividades realizadas durante o desenvolvimento do sistema. Apesar das dificuldades encontradas, a equipe conseguiu realizar entregas importantes, desenvolver funcionalidades essenciais e aplicar conceitos de metodologias ágeis no processo de desenvolvimento de software. O projeto também proporcionou aprendizado técnico e experiência prática com organização de tarefas, comunicação em equipe, integração de tecnologias e adaptação às mudanças durante o desenvolvimento.


14. Anexos

Inserir evidências do processo de desenvolvimento, como:


print do quadro Kanban;

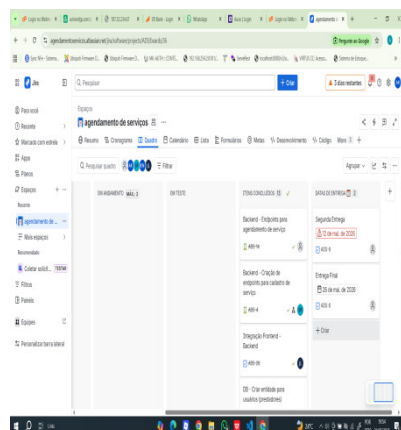


print do Jira ferramenta utilizada;





protótipos das telas;



imagens da aplicação;





☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras


	id	nome_cliente	servico	data_agendamento	status	horario
☐	1	Pedro	Corte Masculino - R\$35	2026-05-26 00:00:00	NULL	07:00

☐ Marcar todos | Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Operações resultantes das consultas

☐ Imprimir ☐ Copiar para a área de transferência ☐ Exportar ☐ Exibir gráfico ☐ Criar view



links do repositório ou apresentação: <https://github.com/Arsidney/Projeto-sistema-agendamento>
